

Isabela Mendes Aguiar Vasconcelos

RA: 221280

Disciplina: Fundamentos de Gestão de Projetos

Projeto Final

Brasília, 29 de abril de 2026

Introdução

Esse trabalho tem como objetivo colocar em prática os conhecimentos de gestão de projetos adquiridos durante o estudo da disciplina. Para isso, atuando como uma gestora de projetos, realizei o planejamento estratégico de uma solução digital baseada em IA para o problema: “ajudar um time interno a gerar insights automáticos a partir de dados de atendimento ao cliente (tickets, chats, e-mails). O time possui volumes gigantescos de interações e não consegue priorizar temas críticos nem gerar planos de ação rápidos”. Além das aulas e conteúdos das plataformas Unifecaf e Rocketseat, foram usadas as ferramentas de IA Claude e Gemini como apoio para ideação e estruturação da solução, assim como ensinado no módulo de Gestão de Produtos e IA da disciplina na Rocketseat.

1. Parte Teórica

1.1 Visão de Produto

- **Descrição do produto digital**

A ProblemAção é uma plataforma de IA Generativa que transforma dados públicos de diferentes canais de atendimento ao cliente em visibilidade imediata e em ações concretas, através de um dashboard de problemas críticos e de tarefas geradas por IA integradas à ferramenta de gerenciamento de projetos do cliente.

- **Público-alvo e problema atendido**

O público-alvo é empresas de grande porte e alto volume de atendimentos ao cliente multicanal. O produto será desenvolvido para atender um problema de um cliente específico, mas pode ser facilmente adaptado a diferentes clientes com as características desse público-alvo.

Os problemas a serem atendidos são a cegueira operacional, a paralisia analítica e a fragmentação de dados. Ou seja, o time sabe que possui problemas, mas tem dificuldade em detectar, agrupar, analisar e priorizar os mais críticos e transformá-los em ação. O ciclo Detecção-ação é extremamente longo.

- **Proposta de valor clara e objetiva**

“Veja o que importa, aja no que importa – antes que vire crise.”

O principal valor do produto se dá em reduzir bruscamente o ciclo detecção-ação: identifica, agrupa e aponta problemas críticos de acordo com seu risco e impacto, e já estrutura a ação e mitigação.

1.2 Definição do MVP

Lista de funcionalidades essenciais do MVP e justificativa de priorização baseada em valor e viabilidade:

1. **Funcionalidade:** Ingestão multicanal

Descrição: Upload CSV + integração com 1 ferramenta (ex. Zendesk) via API. Normalização de campos (data, texto, canal, status).

Prioridade: Essencial – alto valor, alta viabilidade

2. **Funcionalidade:** Clusterização semântica

Descrição: Embeddings via LLM API - agrupamento (HDBSCAN) - rotulação automática dos clusters com linguagem de negócio.

Prioridade: Essencial – alto valor, alta viabilidade

3. **Funcionalidade:** Radar de criticidade

Descrição: Dashboard com cards dos maiores temas, ranqueados por pontuação composta: volume x sentimento_negativo x taxa_crescimento. Atualização diária (batch).

Prioridade: Essencial – alto valor, alta viabilidade

4. **Funcionalidade:** Aprofundamento por tema

Descrição: A partir do dashboard, clicar em um cluster abre painel de análise profunda com causa-raiz gerada por IA (chain-of-thought sobre os tickets do cluster).

Prioridade: Essencial – alto valor, alta viabilidade

5. **Funcionalidade:** Geração de plano de ação

Descrição: O LLM gera plano estruturado: (1) problema, (2) causa raiz provável, (3) ações recomendadas com prioridade MoScow, (4) owner sugerido, (5) KPIs de acompanhamento.

Prioridade: Essencial – alto valor, alta viabilidade

6. **Funcionalidade:** Exportação e importação de planos

Descrição: Exportar plano como PDF, importação automática no Jira via API.

Prioridade: Essencial – alto valor, alta viabilidade

7. **Funcionalidade:** Loop de feedbacks

Descrição: O usuário pode corrigir rótulos de cluster ou marcar plano como “útil/inútil”, alimentando melhoria dos prompts.

Prioridade: Essencial- alto valor, alta viabilidade

8. **Funcionalidade:** Anonimização de PII

Descrição: Pipeline automático que remove CPF, nome, e-mail, telefone antes de enviar ao LLM. Regex + NER local.

Prioridade: Essencial – alto valor, alta viabilidade

9. **Funcionalidade:** Perfis de utilização

Descrição: Perfis: Admin (configura), Gestor (vê dashboard e gera planos), Analista (vê dashboard e recebe atribuição dos planos).

Prioridade: Essencial – alto valor, alta viabilidade

10. **Funcionalidade:** Alertas de temas emergentes

Descrição: Notificação (e-mail ou Teams/Slack) quando um tema novo ultrapassa o limite de criticidade.

Prioridade: Importante - médio valor, alta viabilidade

11. **Funcionalidade:** Chat contextual

Descrição: Interface conversacional onde o gestor pergunta sobre os dados.

Prioridade: Importante - alto valor, média viabilidade

12. **Funcionalidade:** Tendência temporal

Descrição: Gráfico de evolução dos maiores temas nos últimos 7/14/30 dias.

Prioridade: Desejável - médio valor, média viabilidade

13. **Funcionalidade:** Histórico de planos

Descrição: Registro dos planos gerados com status (pendentes/em execução/concluído), comparação temporal e relatório do tempo desde criação até conclusão.

Prioridade: Desejável - médio valor, média viabilidade

As primeiras 7 funcionalidades são críticas e indispensáveis para a solução efetiva do problema do cliente, e como são altamente viáveis são consideradas de prioridade essencial. A 8ª e a 9ª são necessárias para garantir a segurança e conformidade legal do uso da ferramenta, e também altamente viáveis, portanto essenciais.

1.3 Roadmap do produto

Premissas

- Squad de 4-5 pessoas: 1 PM, 1 Designer, 2 Devs Full-stack, 1 Dev ML/Data
- Sprint de 2 semanas
- Total MVP: 10 semanas (5 sprints)

OBS: para o roadmap foram consideradas as funcionalidades essenciais e importantes do MVP.

Sprint	Semanas	Entregas	Detalhamento
S1 - Fundação	1-2	Infra + Pipeline de dados	Setup do projeto (repo, CI/CD, Docker). Pipeline de ingestão CSV → PII removal → PostgreSQL → Embeddings → Qdrant. Clusterização HDBSCAN + scoring básico. RBAC básico. Entrega: dados processados e clusterizados a partir de um CSV real do cliente.
S2 - Dashboard	3-4	Dashboard funcional	Frontend: tela de login + dashboard com radar de criticidade (cards dos top clusters), resumos automáticos por LLM, gráfico de tendência temporal. Drill-down para lista de tickets por cluster. Entrega: dashboard navegável com dados reais. Demo interna.
S3 - Planos de ação	5-6	Planos de ação + Chat	RAG engine (LangChain + Qdrant). Geração de plano de ação estruturado (prompt engineering). Transição fluida: dashboard → clique no tema → chat + plano. Interface de chat contextualizada por cluster. Entrega: fluxo completo de detecção → análise → plano.

S4 - Integração	7-8	Conectores + Alertas	Integração com Zendesk/Freshdesk (ingestão via API). Exportação de planos para Jira + Slack. Alertas de temas emergentes (e-mail/Slack). Feedback loop (validação de clusters e planos pelo usuário). Entrega: produto conectado ao ecossistema real do cliente.
S5 - Polimento e lançamento	9-10	MVP pronto para produção	Testes de carga e segurança. Refinamento de UX com base em feedback do piloto (S4). Documentação. Onboarding flow. Observabilidade (LangSmith + Sentry). Entrega: MVP em produção com 1 squad piloto do cliente.

1.4 Ciclo de Vida da Aplicação

Fase	Duração	Objetivo	Entregas-chave	Crítérios de avanço
Descoberta	4 semanas	Pesquisar e mapear problemas	Entrevistas com 5-8 usuários. Mapeamento de jornada atual. Definição de personas. Análise de dados de amostra. Protótipo lo-fi validado.	80% dos entrevistados confirmam as dores. Dados do cliente são processáveis.

Construção do MVP	10 semanas	Construir produto funcional (Sprints S1-S5)	Plataforma funcional com Dashboard + planos de ação. Piloto interno testado.	Todas as funcionalidades must-have entregues. Zero bugs críticos.
Piloto	4 semanas	Validar valor com usuários reais	1 squad usa a ferramenta no dia-a-dia. Coleta intensiva de feedback. Iteração rápida (hotfixes semanais).	Redução de $\geq 40\%$ no tempo de triagem. NPS ≥ 40 . Uso recorrente ($\geq 3x/semana$).
Escalada	12 semanas	Expandir para toda a operação	Rollout para todos os times. Novas integrações (mais canais). Refinamento de modelos com dados acumulados. Treinamento de usuários.	Adoção $\geq 70\%$ dos times elegíveis. ROI mensurável (horas economizadas).
Maturação	Contínuo	Otimizar e consolidar	Fine-tuning de prompts com feedback acumulado. Automação de processos repetitivos. SLAs definidos. Monitoramento de drift nos clusters.	Custo por insight reduzido em 30%. Uptime $\geq 99.5\%$.

Evolução	Contínuo (Mês 12+)	Expandir para novas verticais	Módulos: predição de churn, análise de NPS, integração com CRM. Possibilidade de oferecer como SaaS multi-tenant para outros clientes.	Novas fontes de receita. Expansão de base de clientes.
----------	-----------------------	----------------------------------	--	--

1.5 Gerenciamento de riscos

Foram identificados os seguintes riscos não relacionados a IA (os riscos específicos serão listados na seção seguinte):

Risco 1: Baixa adoção pelo time

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Estratégias de mitigação: UX simples (dashboard + chat e planos no Jira, sem curva de aprendizado). Briefing semanal automático por e-mail (o produto "vem até o usuário"). Piloto com usuários iniciais entusiastas. Métricas de adoção desde o dia 1.

Risco 2: Dependência de API externa (downtime ou mudança de preço)

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Estratégias de mitigação: Abstração via LangChain (troca de provider em 1 linha). Fallback configurado: se Provider A cai, usa Provider B. Cache de respostas frequentes.

Risco 3: Dados do cliente insuficientes ou mal estruturados

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Estratégias de mitigação: Descoberta(fase 1) inclui análise de amostra de dados reais. Pipeline de normalização tolerante a formatos variados. Documentação de requisitos mínimos de dados.

Risco 4: cliente pede features além do MVP

Probabilidade: Alta

Impacto: Médio

Estratégias de mitigação: Roadmap claro com gates. PM atua como filtro. Backlog de "v1.1" para features desejáveis mas não essenciais. Revisão de escopo a cada sprint.

1.6 Gestão de produtos e IA

- Riscos específicos no uso de IA

Risco 1: Alucinação do LLM (planos de ação com informações inventadas)

Probabilidade: Alta

Impacto: Alto

Estratégias de mitigação: RAG com source attribution obrigatória (toda afirmação cita ticket original). Planos são sempre "sugeridos" — humano aprova. Testes automatizados de faithfulness com RAGAS.

Risco 2: Vazamento de dados sensíveis (PII) para APIs externas de LLM

Probabilidade: Média

Impacto: Crítico

Estratégias de mitigação: Pipeline de anonimização (spaCy NER + regex) antes de qualquer chamada ao LLM. Auditoria semanal de logs. Testes de PII leakage no CI/CD. Contrato de DPA com provider de LLM.

Risco 3: Qualidade da clusterização (clusters sem sentido para o negócio)

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Estratégias de mitigação: Feedback loop: usuário corrige rótulos → few-shot examples melhoram o prompt. Gate 1 valida com dados reais antes de avançar. Parâmetros de HDBSCAN ajustáveis.

Risco 4: Custo de LLM escala descontroladamente com volume de dados

Probabilidade: Médio

Impacto: Médio

Estratégias de mitigação: Usar modelos menores (GPT-4o-mini, Claude Haiku) para tarefas batch. Cache de resumos já gerados (Redis). Embeddings são baratos — custo concentra em geração. Monitoramento de custo via LangSmith. Alerta de orçamento em R\$ X/mês.

Risco 5: Viés nos insights (IA reforça padrões existentes e ignora temas emergentes)

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Estratégias de mitigação: Detecção explícita de "temas novos" (clusters com < 7 dias de vida).
Seção "Sinais Fracos" no dashboard. Revisão humana periódica dos clusters ignorados.

- Considerações éticas, segurança e confiabilidade

Um dos principais pontos sobre ética e segurança é o vazamento de dados sensíveis dos clientes da empresa que irá usar o ProblemAção, por isso esse risco (número 2 nos risco de IA) foi classificado como crítico e deve ser prevenido ao invés de só remediado. Ele impacta também a confiabilidade desses clientes na empresa e IA em si.

- Impactos organizacionais do uso de IA no produto

Esse produto tem sua base toda na geração de informação pela IA, então caso os dados e a análise dos problemas não tenham resultados confiáveis, a ferramenta perde totalmente a utilidade. Por isso é importante que os riscos relacionados a IA sejam bem mapeados, e que seja possível prever possíveis vieses, usar métodos de aprendizado contínuo e refinamento de prompts para garantir a qualidade do produto.

2. Parte Prática

2.1 Canvas de Visão do Produto

ProblemAção

Lean Canvas

PROBLEMAS

Cegueira operacional: o time não consegue identificar problemas críticos

Ciclo detecção-ação lento: perde-se a janela de ação

Dados fragmentados: interações com os clientes ocorrem em canais distintos não agrupáveis

ALTERNATIVAS EXISTENTES

Planilhas manuais, dashboards não inteligentes, consultoria

SOLUÇÕES

Pipeline de ingestão unificado, em que os dados são clusterizados por tema e apresenta:

- Dashboard com radar de criticidade
- Geração de planos de ação integrados à ferramenta de gestão de projetos

MÉTRICAS

Redução no tempo médio de detecção-ação. < 1 dia

Percentual de plano de ação aceitos > 50%

Percentual de clusters validados > 80%

PROPOSTA ÚNICA DE VALOR

Veja o que importa, aja no que importa – antes que vire crise

ANALOGIA DE ALTO NÍVEL

É como um Waze para o atendimento ao cliente: em vez de ficar perdido ou preso no trânsito, você vê congestionamentos em tempo real e recebe rotas alternativas.

VANTAGEM COMPETITIVA

Fluxo integrado de detecção E ação

Efeito de rede de dados: quanto mais o time usa (corrige clusters, avalia planos) melhor fica a identificação e planos de ação

CANAIS

Linked-in + conteúdo em blogs/newsletter

Eventos de CX e Customer Success

Venda consultiva direta

SEGMENTOS DE CLIENTES

Empresa de grande porte (500+ funcionários), com operações de atendimento ao cliente de alto volume (+10k tickets/mês), que já utilizam ferramentas de helpdesk mas não extraem inteligência dos dados

PERSONA INICIAL

Empresa de e-commerce, com 1500 funcionários e 50k tickets/mês de operações de atendimento ao cliente e utiliza Zendesk

ESTRUTURA DE CUSTOS

Custos fixos: salários do time, ferramentas técnicas

Custos variáveis: infraestrutura Cloud, APIs de LLM, Vector DB

FONTES DE RECEITA

SaaS por assentos + volume: assinatura mensa com base em nº de usuários + tier por volume de tickets processados


Onboarding assistido: configuração de integrações, calibração inicial dos clusters, treinamento

Tier premium: funcionalidades avançadas como integrações ilimitadas, SLA de resposta, relatórios customizados

2.2 Documento de MVP

ProblemaAção MVP			Critérios de aceitação	
Funcionalidade	Descrição	Prioridade		
1	Ingestão multicanal		Essencial	CSV até 500MB aceito e validado (campos obrigatórios). Integração Zendesk importa tickets das últimas 24h via job diário. Registros normalizados para schema interno. Duplicatas ignoradas. Relatório pós-ingestão com totais e erros.
2	Clusterização semântica		Essencial	Embeddings gerados para 100% dos tickets novos em até 2h (50k). Clusters com mínimo 5 tickets, rotulados em linguagem de negócio pelo LLM. ≥80% dos tickets coerentes com o rótulo (validação humana). Clusters <1% agrupados em "Temas menores".
3	Radar de criticidade		Essencial	Top 10 clusters por score (volume x sentimento x crescimento). Cards com rótulo, score 0-100, volume, sentimento e variação %. Filtros por período, canal e criticidade. Carregamento <2s. Pesos configuráveis pelo Admin.
4	Aprofundamento por tema		Essencial	Panel abre em <3s com: descrição expandida, causa-raiz com raciocínio explícito citando ≥2 tickets, lista paginada de tickets (ordenável por data/sentimento). Botões claros para "Gerar plano" e "Conversar sobre o tema".
5	Geração de plano de ação		Essencial	Plano em <10s com 5 seções obrigatórias (problema, causa-raiz, 3-7 ações MoSCoW com prazo, owner por cargo/área, ≥2 KPIs). Cita ≥3 tickets como evidência. Editável inline. Botão "Regenerar" sem perder versão anterior. Disclaimer "Gerado por IA".
6	Exportação e importação de planos		Essencial	Export PDF formatado em <5s. Card no Jira com título, descrição e labels. Mensagem Slack formatada. Preview + confirmação antes do envio. Log de exportações. Credenciais encrypted at rest.
7	Anonimização de PII		Essencial	Detecta e substitui CPF, CNPJ, nomes, e-mail, telefone e endereço por placeholders. Taxa de detecção ≥95%. Anonimização antes de qualquer chamada a LLM externo. Pipeline local (spaCy + regex). Teste automatizado no CI/CD com 50 edge cases. Dados originais restritos ao Admin no PostgreSQL
8	Perfis de utilização		Essencial	3 perfis com permissões progressivas: Analista (visualiza), Gestor (+chat, planos, exportação), Admin (+config, usuários, logs). Acesso negado exibe mensagem e registra log. Auth via e-mail+senha (bcrypt). Sessão expira após 8h de inatividade.
9	Loop de feedbacks		Essencial	Correção de rótulo inline (Gestor+). 🟡 / 🟠 em planos e respostas do chat, com comentário opcional. Feedbacks armazenados com metadados completos. Relatório agregado para Admin. Rótulos corrigidos viram few-shot examples automaticamente. Correções do usuário nunca revertidas sem ação do Admin.
10	Alertas de temas emergentes		Importante	Detecta clusters novos ou com crescimento ≥X% (configurável). Notificação em até 15min via e-mail ou Slack. Conteúdo: nome, score, volume, variação e link direto. Sem alertas duplicados por ciclo.
11	Chat contextual		Importante	Chat pré-contextualizado no cluster. Resposta em <5s (streaming). Respostas baseadas em RAG com citação de fonte. Suporta filtros temporais, volume, perfil e conteúdo. Recusa perguntas fora do escopo. Histórico de 20 turnos. PII nunca exibida.
12	Tendência temporal		Desejável	Gráfico de linhas dos top 5 clusters com toggle de período (7/14/30d). Tooltip com data, volume, score e variação. Carregamento <3s, responsivo. Clusters extintos aparecem tracejados com label "resolvido?".
13	Histórico de planos		Desejável	Planos salvos com metadados e status (pendente/execução/concluído) editável. Filtros por status, tema, data, autor. Comparação temporal: volume/sentimento entre plano anterior e atual (melhorou/piorou/estabilizou). Flag "ação atrasada" após 90 dias pendente.

2.3 Roadmap Visual

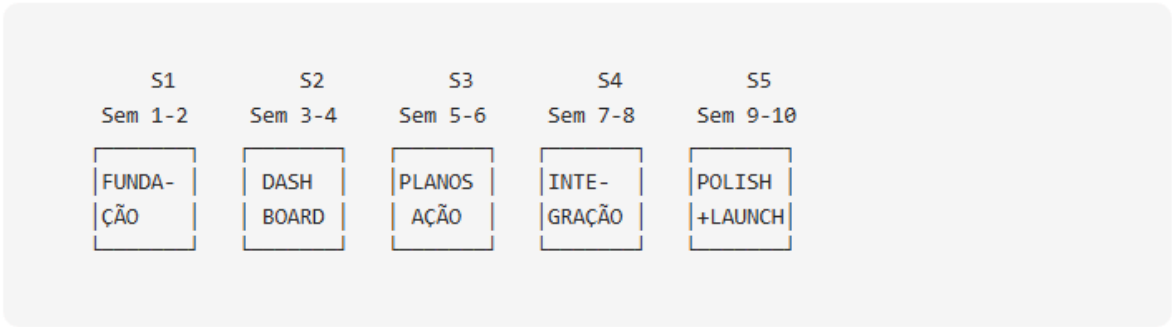

Sprint	Semanas	Entregas	Detalhamento
S1 - Fundação	1-2	Infra + Pipeline de dados	Setup do projeto (repo, CI/CD, Docker). Pipeline de ingestão CSV → PII removal → PostgreSQL → Embeddings → Qdrant. Clusterização HDBSCAN + scoring básico. RBAC básico. Entrega: dados processados e clusterizados a partir de um CSV real do cliente.
S2 - Dashboard	3-4	Dashboard funcional	Frontend: tela de login + dashboard com radar de criticidade (cards dos top clusters), resumos automáticos por LLM, gráfico de tendência temporal. Drill-down para lista de tickets por cluster. Entrega: dashboard navegável com dados reais. Demo interna.
S3 - Planos de ação	5-6	Chat + Planos de ação	RAG engine (LangChain + Qdrant). Interface de chat contextualizada por cluster. Geração de plano de ação estruturado (prompt engineering). Transição fluida: dashboard → clique no tema → chat + plano. Entrega: fluxo completo detecção → análise → plano.
S4 - Integração	7-8	Conectores + Alertas	Integração com Zendesk/Freshdesk (ingestão via API). Export de planos para Jira + Slack. Alertas de temas emergentes (e-mail/Slack). Feedback loop (validação de clusters e planos pelo usuário). Entrega: produto conectado ao ecossistema real do cliente.
S5 - Polish + Launch	9-10	MVP pronto para produção	Testes de carga e segurança. Refinamento de UX com base em feedback do piloto (S4). Documentação. Onboarding flow. Observabilidade (LangSmith + Sentry). Entrega: MVP em produção com 1 squad piloto do cliente.

2.4 Matriz de Riscos

#	Risco	Probabilidade	Impacto	Categoria	Estratégia	Responsável	Plano de mitigação
1	Alucinação do LLM — planos de ação com informações inventadas	Alta	Alto	Técnico	Mitigar	Dev ML/Data	RAG com <u>source attribution</u> obrigatória (toda afirmação cita ticket original). Planos são sempre "sugeridos" — humano aprova. Testes automatizados de <u>faithfulness</u> com RAGAS.
2	Vazamento de dados sensíveis (PII) para APIs externas de LLM	Média	Crítico	Segurança	Prevenir	Dev ML/Data + PM	Pipeline de anonimização (<u>spaCy</u> NER + <u>regex</u>) antes de qualquer chamada ao LLM. Auditoria semanal de logs. Testes de PII leakage no CI/CD. Contrato de DPA com <u>provider</u> de LLM.
3	Qualidade da clusterização — clusters sem sentido para o negócio	Média	Alto	Técnico	Mitigar	Dev ML/Data	Feedback loop: usuário corrige rótulos → <u>few-shot examples</u> melhoram o prompt. Gate 1 valida com dados reais antes de avançar. Parâmetros de HDBSCAN ajustáveis.
4	Baixa adoção — time continua usando planilhas	Média	Alto	Mercado	Prevenir	PM + Designer	UX simples (dashboard + chat, sem curva de aprendizado). Briefing semanal automático por e-mail (o produto "vem até o usuário"). <u>Pilot</u> com <u>early adopters</u> entusiastas. Métricas de adoção desde o dia 1.
5	Custo de LLM escala descontroladamente com volume de dados	Média	Médio	Financeiro	Mitigar	PM + Dev ML/Data	Usar modelos menores (GPT-4o-mini, Claude Haiku) para tarefas batch. Cache de resumos já gerados (Redis). <u>Embeddings</u> são baratos — custo concentra em geração. Monitoramento de custo via <u>LangSmith</u> . Budget alert em \$X/mês.
6	Dependência de API externa (<u>OpenAI</u> / <u>Anthropic</u>) — <u>downtime</u> ou mudança de <u>pricing</u>	Baixa	Alto	Técnico	Transferir	Dev Backend	Abstração via <u>LangChain</u> (troca de <u>provider</u> em 1 linha). <u>Fallback</u> configurado: se <u>Provider A</u> cai, usa <u>Provider B</u> . Cache de respostas frequentes.
7	Dados do cliente insuficientes ou mal estruturados	Média	Alto	Dados	Mitigar	PM + Dev Backend	Discovery (fase 1) inclui análise de amostra de dados reais. Pipeline de normalização tolerante a formatos variados. Documentação de requisitos mínimos de dados.
8	Scope creep — cliente pede <u>features</u> além do MVP	Alta	Médio	Gestão	Prevenir	PM	Roadmap claro com <u>gates</u> . PM atua como filtro. Backlog de "v1.1" para <u>features</u> desejáveis mas não essenciais. Revisão de escopo a cada sprint.
9	Latência — dashboard lento ou chat demora para responder	Média	Médio	Técnico	Mitigar	Dev Backend + Dev Frontend	Processamento pesado em batch (não <u>real-time</u>). Cache de clusters/resumos. Streaming de respostas do chat (<u>Vercel AI SDK</u>). Meta: dashboard <2s, primeira palavra do chat <1s.
10	Viés nos insights — IA reforça padrões existentes e ignora temas emergentes	Baixa	Alto	Ético/Técnico	Mitigar	Dev ML/Data + PM	Detecção explícita de "temas novos" (clusters com <7 dias de vida). Seção "Sinais Fracos" no dashboard. Revisão humana periódica dos clusters ignorados.

2.5 Material complementar

Link dos artefatos no Notion:

https://www.notion.so/Projeto-final-de-Fundamentos-de-Gest-o-de-Projetos-351d461631c780f0bc17d296026ef0f6?source=copy_link

Link dos artefatos no Github: <https://github.com/isabelamendesv/unifecaf-fundamentos-gestao-projetos>

3. Video Pitch

Link do vídeo no Youtube: <https://youtu.be/vLEdHs0AVQo>
